

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1» г. Белгорода имени Героя Российской Федерации
Антонна Геннадьевича Копейкина

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «НАВИГАЦИЯ»

Белгород, 2023 год

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Навигация»

ПОДГОТОВЛЕНО

Черненькая Д.Р.

«28» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Гребенников Ю.Б.

«28» сентября 2023 г.

Общие данные:

Заказчик: Гребенников Ю.Б., директор MAOY «ЦО №1»

Руководитель процесса: Бабкин Е.Н., заместитель директора MAOY «ЦО №1»

Команда проекта:

Черненькая Д.Р., советник директора по воспитанию;

Шопинская Ю.А., учитель русского языка и литературы;

Жигулина Т.С., учитель русского языка и литературы;

Соловей В.А., педагог-организатор.

Границы процесса:

Начало процесса: с момента входа на территорию школы

Конец процесса: до входа в учебный класс, а также перехода между кабинетами/помещениями школы

Цель (и):

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, час.	7,5 мин	3 мин
Уровень удовлетворенности организацией навигации, %	50%	80%
Плотность потоков обучающихся на лестничных пролетах во время перемены, уч/мин	78/мин	35/мин

Обоснование:

1. Длительный поиск необходимого учебного класса, вспомогательного кабинета, помещения;
2. Длительные переходы между этажами и кабинетами;
3. Опоздания на уроки;
4. Потеря времени на отдых;
5. Риск травматизма.

Эффекты:


1. Модернизация системы навигации на этажах
2. Создание обновленных план-схем этажей
3. Разведение потоков с помощью новых схем, визуализация в виде стрелок на полу и стенах
4. Использование разных лестниц

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта: 1 октября .2023 г.
2. Анализ текущей ситуации (02-06 октября 2023 г.):
 - разработка текущей карты процесса (09-13 октября 2023 г.)
 - поиск и выявление проблем (23 октября – 12 ноября .2023 г.)
 - разработка целевой карты процесса (13-23 ноября .2023 г.)
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта (23-30 ноября .2023 г.)
3. Реализация мероприятия «дорожной карты» (01-25 декабря 2023г.)
4. Завершение проекта (25 декабря .2023 г.)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса
«Метод линейного картирования»

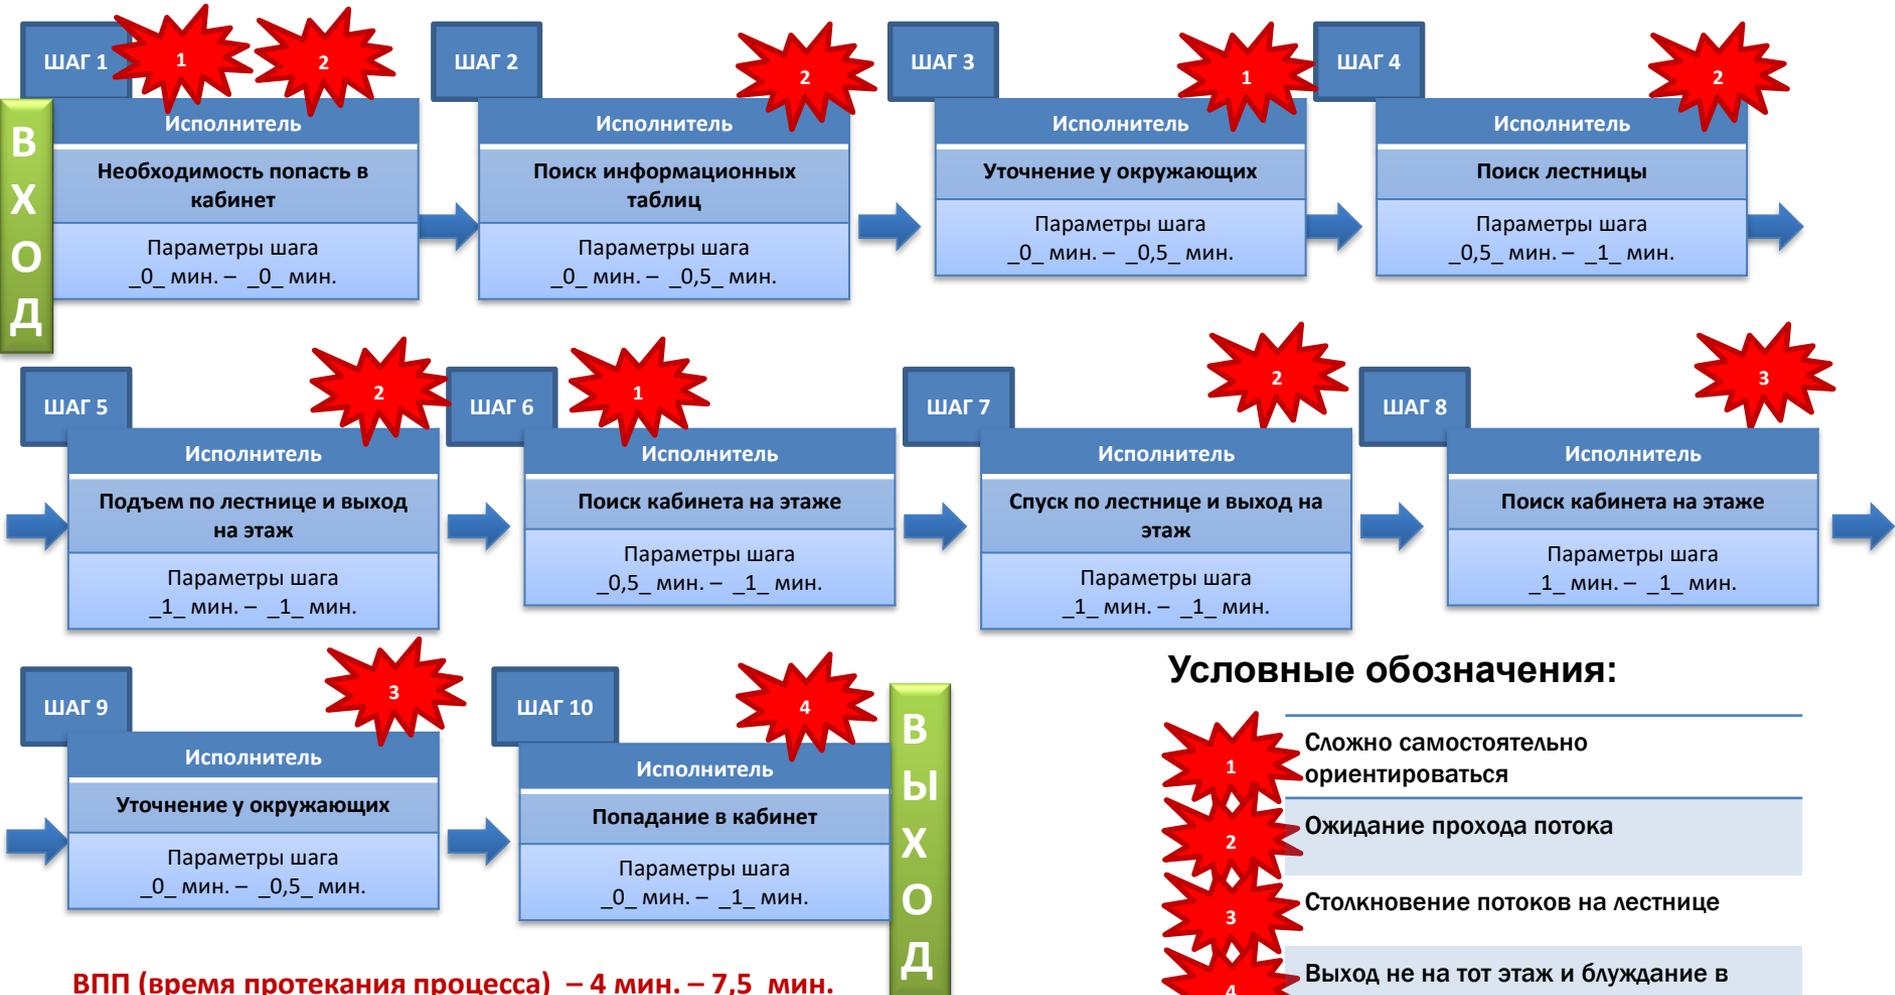

ВПП (время протекания процесса) – 4 мин. – 7,5 мин.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Пирамида проблем



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Анализ проблем

Проблема	Способ решения	Экономия времени
Сложно самостоятельно ориентироваться	Модернизация системы навигации на этажах (номера кабинетов, направляющие стрелки и т.д.); Создание обновленных план-схем этажей	0,5 мин
Ожидание прохода потока	Разведение потоков с помощью новых схем, визуализация в виде стрелок на полу и стенах; использование разных лестниц	1 мин
Столкновение потоков на лестнице	Разведение потоков с помощью новых схем, визуализация в виде стрелок на полу и стенах; использование разных лестниц	1 мин
Выход не на тот этаж и блуждание в поисках	Модернизация системы навигации на этажах; Создание обновленных план-схем этажей	0,5 мин

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния процесса
«Навигация»

Линейный способ картирования
(выбор способа картирования осуществляется самостоятельно)



ВПП (время протекания процесса) – 0 мин. - 3 мин.

Условные обозначения:

- 1 Модернизация системы навигации на этажах
- 2 Создание обновленных план-схем этажей
- 3 Разведение потоков с помощью новых схем, визуализация в виде стрелок на полу и стенах
- 4 Использование разных лестниц

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Дорожная карта по оптимизации процесса
«Навигация»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель проекта

« ____ » _____ 2023_ г.

№	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки
1.	Сложно самостоятельно ориентироваться	Расположение учебных кабинетов в разных частях здания	Модернизация системы навигации на этажах (номера кабинетов, направляющие стрелки и т.д.)	Протокол №271	Шопинская Ю.А.	12-25.12. 2023
			Создание обновленных план-схем этажей	Протокол №273	Соловей В.А.	01-10.12.2023
2.	Выход не на тот этаж и блуждание в поисках	Расположение учебных кабинетов в разных частях здания	Разведение потоков с помощью направляющих стрелок	Протокол №272	Жигулина Т.С.; Черненькая Д.Р.	11-25.12.2023
3.	Ожидание прохода потока	Большой поток учащихся и учителей на лестничных пролетах во время перемен	Разведение потоков с помощью направляющих стрелок	Протокол №272	Жигулина Т.С.; Черненькая Д.Р.	11-25.12.2023
4.	Столкновение потоков на лестнице	Большой поток учащихся и учителей на лестничных пролетах во время перемен	Модернизация системы навигации на этажах и лестничных пролетах	Протокол №271	Шопинская Ю.А. Соловей В.А.	12-25.12. 2023
			Создание обновленных план-схем этажей	Протокол №273		01-10.12.2023
